

**ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: П. МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ,
УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 31**

**Муниципальное образование «Междуреченское»
30 октября 2018 года**

Основание для выполнения работ:

Муниципальный контракт: от 14.05.2018 № 0124300022118000097-0159193-03

Заказчик: Администрация МО «Междуреченское»
(ИНН 2919005993)

Руководитель заказчика: Шатровская Елена Юрьевна,
глава МО «Междуреченское», 89214737171, mo_a@mail.ru

Подрядная организация: ООО «РемСервисСтрой»
(ИНН 2901219867)

Руководитель подрядчика: Шириков Сергей Владимирович,
директор, +79522508043, rss-11@mail.ru

Сроки выполнения работ:

Начало – 14.05.2018.

Окончание – 15.08.2018.



БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: П. МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д.31 (ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя
Правительства Архангельской области

_____ А.Г. Шестяков.

График производства работ по муниципальному контракту от 14.05.2018 г. № 0124300022118000097-0159193-03
(указать реквизиты МК)

заключенному между администрацией муниципального образования "Междуреченское"
(указать МО)
и Общество с ограниченной ответственностью "РемСервисСтрой"
(указать наименование подрайонной организации)

Вид территории (-ий) (дворовая, общественная, парк) дворовая

Адрес (-а) территории (-ий) п. Междуреченский, ул. Дзержинского, д. 31

№ п/п	Наименование работ (укрупненно)	Дата начала проведения работ (число, месяц, год)	Дата завершения работ (число, месяц, год)
п. Междуреченский, ул. Дзержинского, д. 31			
1	Разработка покрытий и оснований: цементно-бетонных, 3,2 м3 покрытия	10.06.2018	13.07.2018
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из-песчано-гравийной смеси, 5,4 м3 покрытия	10.06.2018	13.07.2018
3	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком, 18 м2 покрытия	10.06.2018	13.07.2018
4	Планировка площадей: механизированным способом, 120 м2	10.06.2018	13.07.2018
5	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком, 120 м2 покрытия	14.07.2018	10.08.2018
6	Установка скамеек, 4 шт.	14.07.2018	10.08.2018
7	Установка урн, 2 шт.	14.07.2018	10.08.2018
8	Установка стоек для выкапывания ковровых покрытий, 1 шт.	14.07.2018	10.08.2018
9	Устройство светильников над входными дверями у подъездов, 2 шт.	14.07.2018	10.08.2018

Дата составления: 28.05.2018

СОГЛАСОВАНО: _____

СОГЛАСОВАНО: _____


М.П.  М.П. Междуреченское
(указать должность и фамилию представителя АМКО)

М.П.  ООО "РСС"
(указать наименование подрайонной организации)


М.П. С. В. Ширяков



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: П. МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д.31

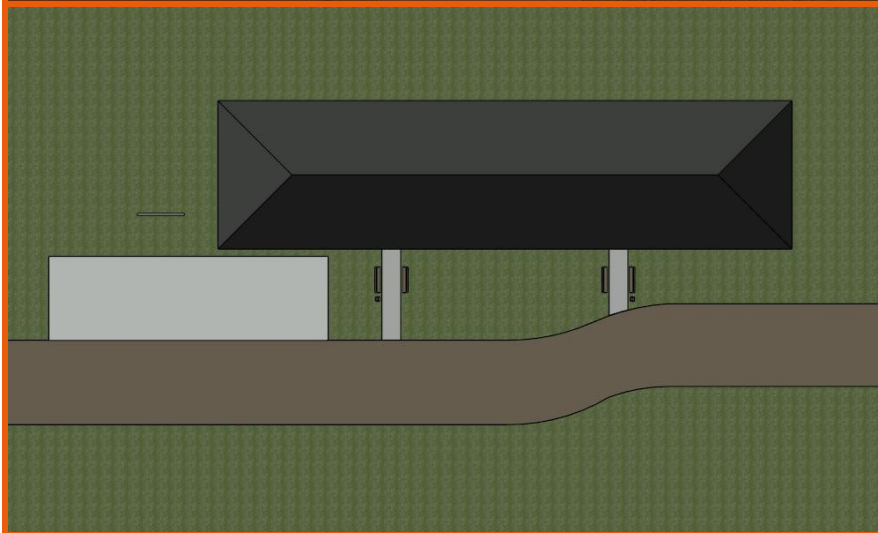

Условные обозначения:

-  - стойка для выхлapyвания ковровых покрытий;
-  - стоянка для автотранспортных средств;
-  - скамья деревянная на железном основании;
-  - урна металлическая.




**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:
П. МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д.31**

№ п/п	Виды работ	Объем работ, ед. изм.	Стоимость работ, тыс. рублей
1	Установка плит для временной стоянки автомобилей	120 м ²	132,21
2	Выравнивание плит у подъезда	18 м ²	18,89
3	Установка скамеек	4 шт.	41,92
4	Установка урн	2 шт.	8,44
5	Устройство освещения	2 шт.	5,49
6	Установка стоек для выхлapyвания ковров	1 шт.	5,48



**ФОТООТЧЕТ ДО НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ:
П. МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д.31**

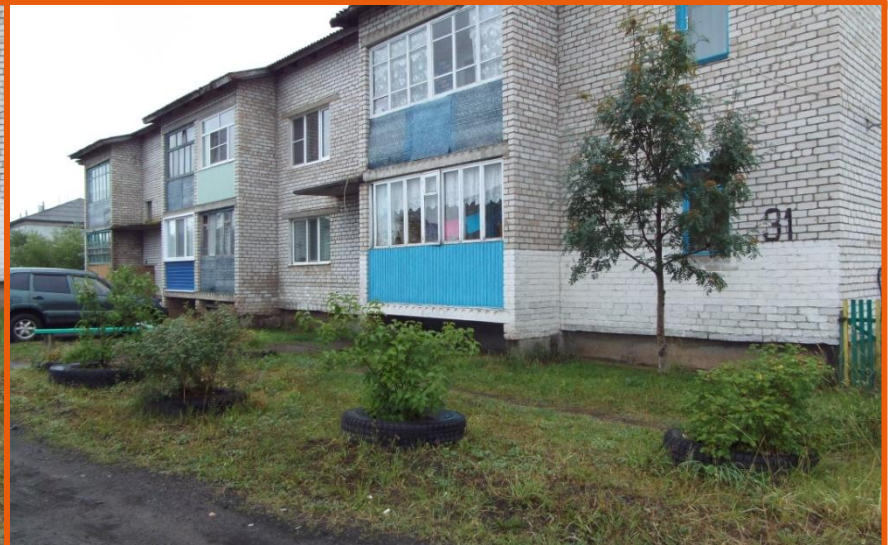

**ФОТООТЧЕТ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ:
П. МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д.31**



**ФОТООТЧЕТ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ
ДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ:
П. МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д.31**

